


037.1 SST - Gebäude B Schulsanierung Teningen

Übersicht (EUR mit USt.)

	Budgets	Auftr.*	Freig.*	Hochr.	+/-	%
Summe	2.747.945	2.768.219	2.774.938	2.810.521	+62.576	+2,3%
200 Herrichten und Erschließen	9.044			0	-9.044	-100,0%
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.591.127	1.382.606	1.476.814	1.476.814	-114.313	-7,2%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	525.682	589.186	555.166	575.303	+49.621	+9,4%
500 Außenanlagen	16.720			0	-16.720	-100,0%
600 Ausstattung und Kunstwerke	6.000	67.830	64.023	64.023	+58.023	+967,0%
700 Baunebenkosten	599.372	728.597	678.936	694.382	+95.010	+15,9%


037.2 SST - Neubau Verbindungsspanne Schulsanie

Übersicht (EUR mit USt.)

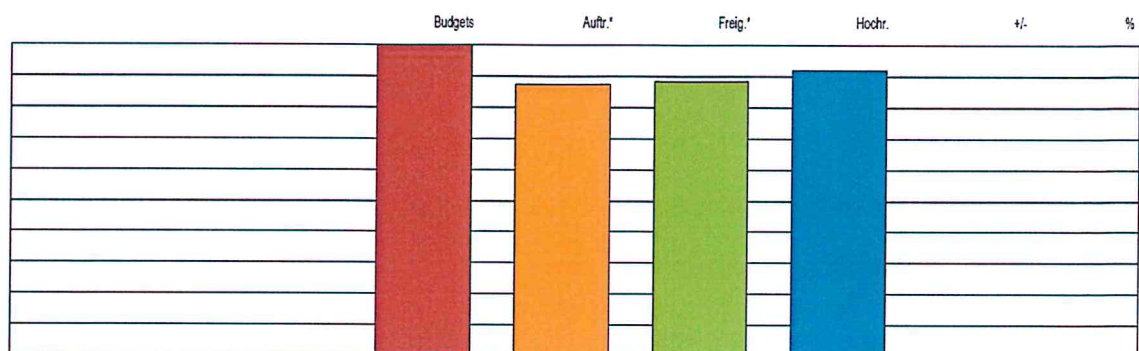

	Budgets	Auftr.*	Freig.*	Hochtr.	+/-	%
Summe	5.782.972	5.052.113	5.109.192	5.333.276	-449.696	-7,8%
200 Herrichten und Erschließen	3.808			0	-3.808	-100,0%
300 Bauwerk - Baukonstruktion	3.378.855	2.642.657	2.902.869	2.923.014	-455.841	-13,5%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	649.015	768.543	613.508	786.552	+137.537	+21,2%
500 Außenanlagen	30.583			0	-30.583	-100,0%
600 Ausstattung und Kunstwerke	564.464	519.689	477.122	478.267	-86.196	-15,3%
700 Baunebenkosten	1.156.248	1.121.225	1.115.692	1.145.442	-10.806	-0,9%

Übersicht (EUR mit USt.)

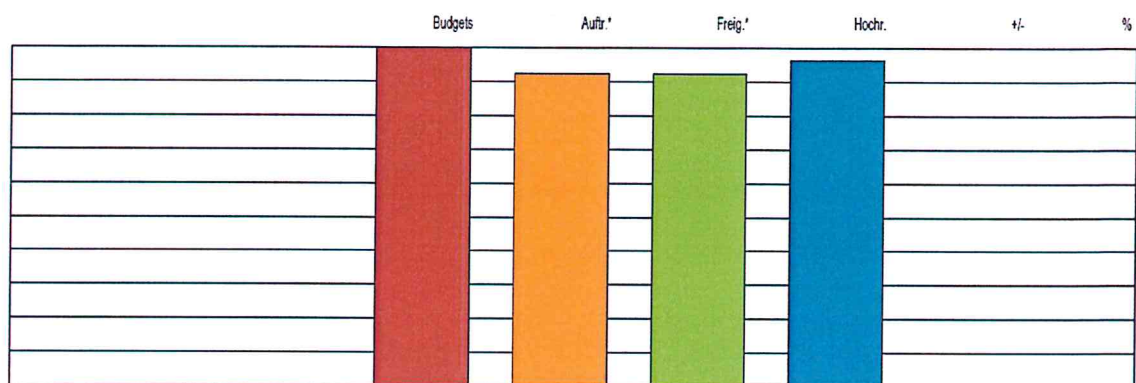

	Budgets	Auftr.*	Freig.*	Hochr.	+/-	%
Summe	9.092.167	8.395.779	8.388.594	8.760.330	-331.837	-3,6%
037.1 SST - Gebäude B Schulsanierung Tenin	2.747.945	2.768.219	2.774.938	2.810.521	+62.576	+2,3%
037.2 SST - Neubau Verbindungsspange Schu	5.782.972	5.052.113	5.109.192	5.333.276	-449.696	-7,8%
037.8 SST - Schulhöfe Freianlagen	561.250	575.448	504.464	616.533	+55.283	+9,9%
